


点検実施日	年 月 日 ( )			
元方事業者				
工事名称				
検査工区				元請確認
施工協力会社		作業主任者(職長)		
点検者	会社名	氏名		
	点検理由	※該当に○印： 組立後 ・ 変更後 ・ 悪天候後 ・ 一部解体後 ・ その他 ( )		

分類	点検項目	点検内容	判定	備考
基礎	基礎の状態	1 地盤面は安定した状態にあるか(目視による)	良 否	
	敷板、敷角	2 地面上に建てる場合、状況に応じて敷板、敷角を使用しているか	良 否	
基礎との固定状態	ジャッキベース類	3 ジャッキベースは敷板、敷角に正しく固定されているか	良 否	
		4 ジャッキベースのレベルは正しいか	良 否	
支柱とジャッキベース	ジャッキベース	5 支柱は正しくジャッキベースに差し込まれているか	良 否	
		6 ジャッキハンドルと支柱下端の間に遊びはないか	良 否	
滑動防止	根がらみ	7 根がらみは水平に保たれているか	良 否	
		8 敷板にジャッキベースを二本以上の釘等で固定しない場合：桁行方向、梁間方向に根がらみを設置しているか	良 否	
		9 敷板にジャッキベースを二本以上の釘等で固定する場合：梁間方向に根がらみを設置しているか(桁行方向の根がらみは省略可能)	良 否	
		10 根がらみ用布材のクサビは正しく打ち込まれているか	良 否	
支柱の接続	抜け止め処置	11 支柱接続部はロック金具により確実に抜け止めされているか	良 否	
支柱の間隔	支柱	12 支柱の設置間隔は1850mm以下であるか	良 否	
作業床	床付き布わく	13 変形、損傷又は腐食していないか	良 否	
		14 床付き布わくのつかみ金具の外れ止めは確実にロックしているか	良 否	
		15 床付き布わく間の隙間は3cm以下か	良 否	
		16 床付き布わくと建地の隙間は12cm未満か	良 否	
布材、ブラケット等	設置方法	17 布材の設置位置は指示通りか	良 否	
		18 布材のクサビは正しく打ち込まれているか	良 否	
		19 水平になっているか	良 否	
先行手すり筋交い	設置方法	20 取り外し又は脱落していないか	良 否	
		21 斜め材先端のクサビに浮きがないか	良 否	
		22 上部フックは確実に設置しているか	良 否	
水平拘束	壁つなぎ	23 垂直水平方向とも指定通りの間隔で設置されているか	良 否	
		24 躯体側・足場側ともに堅固な位置に正しく固定されているか	良 否	
昇降設備	階段等	25 2段手すり及び、階段開口部手すりが設置されているか	良 否	
		26 階段設置の際は、2スパン以内毎に踊り場が設けられているか	良 否	
開口部	梁わく等	27 2スパン開口時は、開口部両横側スパンと梁枠直上に二層以上の先行手すり筋交いが前踏み側、後踏み側共に取付されているか	良 否	
		28 3スパン開口時は、開口部両横側スパンと梁枠直上に二層以上の先行手すり筋交いが前踏み側、後踏み側共に取付されているか	良 否	
		29 4スパン開口時は、開口部両横側スパンと梁枠直上に三層以上の先行手すり筋交いが前踏み側、後踏み側共に取付されているか	良 否	
		30 梁枠の両端支持部の支柱には壁つなぎが設けられているか	良 否	
安全設備	転落・墜落防護工	31 2段手すりの高さは床面から、上さんは85cm以上、中さんは35cm以上50cm以下で設置しているか	良 否	
外観検査	建地	32 建地は垂直に組み上がっているか	良 否	
	不良部材	33 著しく変形や損傷、腐食のある不良部材を使用していないか	良 否	
最終確認	組立図	34 部材の組み忘れがないか	良 否	
		35 組立図通りに部材の配置、取付が行われているか	良 否	



### 特記事項

--

# ミレニウム足場点検ポイント

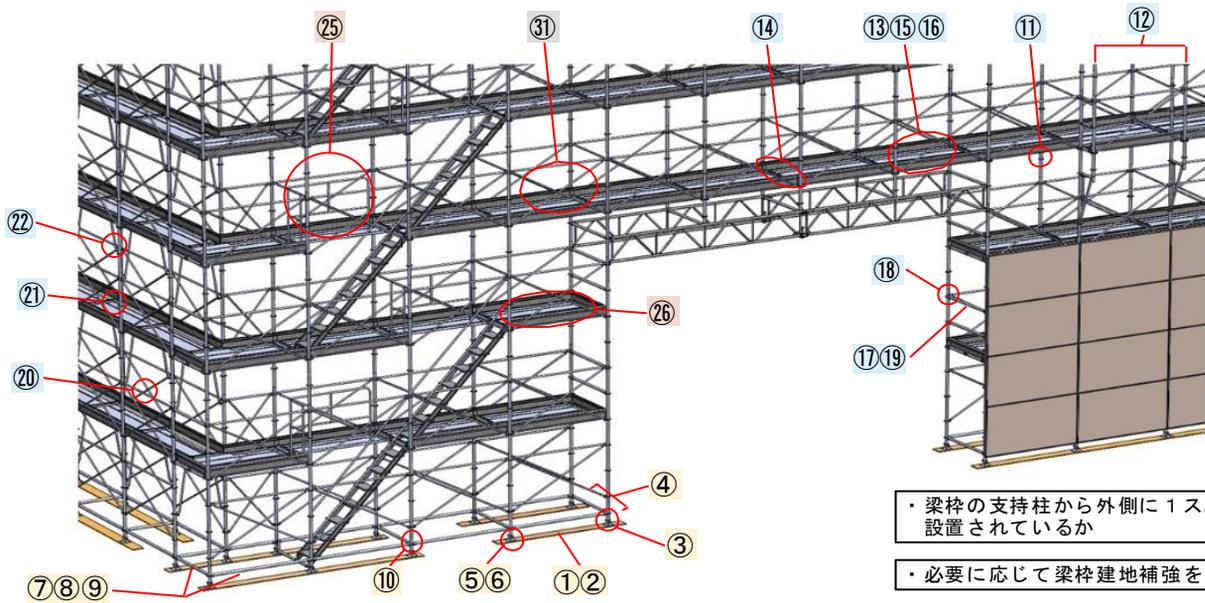

- ・ 梁枠の支柱から外側に1スパン以上設置されているか
- ・ 必要に応じて梁枠建地補強をしているか

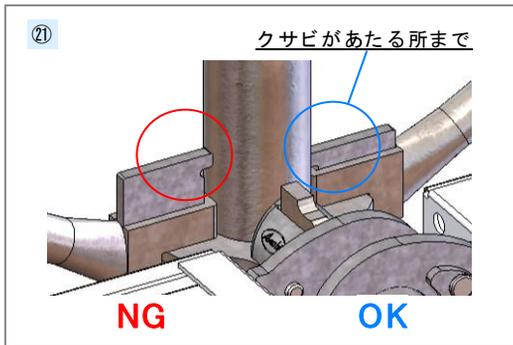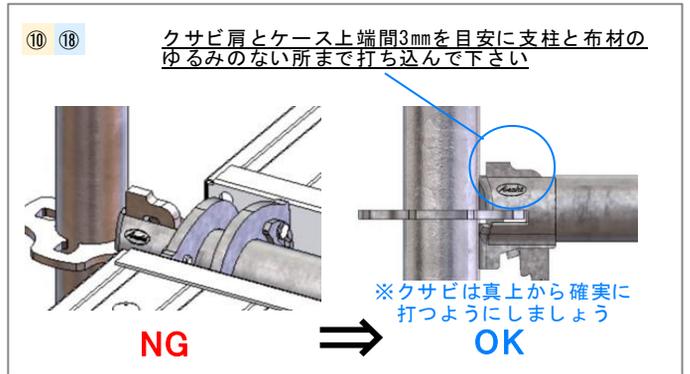

- |   |   |
|---|---|
| <p>① 地盤面は安定した状態にあるか(目視による)</p> <p>② 地面上に建てる場合、状況に応じて敷板、敷角を使用しているか</p> <p>③ ジャッキベースは敷板、敷角に正しく固定されているか</p> <p>④ ジャッキベースのレベルは正しいか</p> <p>⑤ 支柱は正しくジャッキベースに差し込まれているか</p> <p>⑥ ジャッキハンドルと支柱下端の間に遊びはないか</p> <p>⑦ 根がらみは水平に保たれているか</p> <p>⑧ 敷板にジャッキベースを二本以上の釘等で固定しない場合：桁行方向、梁間方向に根がらみを設置しているか</p> <p>⑨ 敷板にジャッキベースを二本以上の釘等で固定する場合：梁間方向に根がらみを設置しているか(桁行方向の根がらみは省略可能)</p> <p>⑩ 根がらみ用布材のクサビは正しく打ち込まれているか</p> <p>⑪ 支柱接続部はロック金具により確実に抜け止めされているか</p> | <p>⑫ 支柱の設置間隔は1850mm以下であるか</p> <p>⑬ 変形、損傷又は腐食していないか</p> <p>⑭ 床付き布わくのつかみ金具の外れ止めは確実にロックしているか</p> <p>⑮ 床付き布わく間の隙間は3cm以下か</p> <p>⑯ 床付き布わくと建地の隙間は12cm未満か</p> <p>⑰ 布材の設置位置は指示通りか</p> <p>⑱ 布材のクサビは正しく打ち込まれているか</p> <p>⑲ 水平になっているか</p> <p>⑳ 取り外し又は脱落していないか</p> <p>㉑ 斜め材先端のクサビに浮きがないか</p> <p>㉒ 上部フックは確実に設置しているか</p> <p>㉓ 2段手すり及び、階段開口部手すりが設置されているか</p> <p>㉔ 階段設置の際は、2スパン以内毎に踊り場が設けられているか</p> <p>㉕ 2段手すりの高さは床面から、上さんは85cm以上、中さんは35cm以上50cm以下で設置しているか</p> |
|---|---|
